

## 特定事業等の進捗状況

### I 整理対象

「重点整備地区別計画(以下「地区別計画」という。)」に位置づけた特定事業等(683事業)について、「文京区バリアフリー基本構想(以下「現行基本構想」という。)」の目標年次である令和7年度末時点(見込みを含む)の進捗状況を把握しました。

表 地区別計画における事業数(中間評価(R5.3)を踏まえた計画変更後)

重点整備地区	短期 【~R2年度】	中期 【R3~7年度】	長期 【R8年度~】	継続	順次・随時	その他	合計
都心地域	37	14	39	24	5	12	131
下町隣接地域	22	11	6	28	0	1	68
山の手地域東部	15	24	19	53	0	1	112
山の手地域中央	25	26	33	63	0	4	151
山の手地域西部	14	16	16	28	2	1	77
共通	16	23	29	37	36	3	144
合計	129	114	142	233	43	22	683

※「共通」は、重点整備地区境界を越えて実施する事業で、道路特定事業や交通安全特定事業、公共交通特定事業のバス事業が該当します。

表 実施時期の説明

実施時期	説明
短期	平成 28・29 年度～令和2年度に実施する事業
中期	令和3年度～令和7年度に実施する事業
長期	令和8年度以降に実施する事業
継続	計画期間を通じて継続的に実施する事業
順次・随時	計画期間を通じて順次または随時実施する事業
その他	実現が困難と判断され実施しないこととした事業や、施設の閉館等の理由により予定事業を中止した事業

## 2 特定事業等の着手率及び完了・継続率の整理

各施設設置管理者等による特定事業等の進捗報告を基に、地区及び特定事業種、ハード・ソフト分類ごとに、「事業全体着手率」、「事業全体完了・継続率」、「短期・中期事業着手率」、「短期・中期事業完了・継続率」を整理しました。

「事業全体着手率」とは、地区別計画に位置づけた全事業のうち、事業状況が〔完了〕〔継続〕〔実施中〕の事業の割合を示したものです。また、「事業全体完了・継続率」とは、地区別計画に位置づけた全事業のうち、事業状況が〔完了〕〔継続〕の事業の割合を示したものです。

「短期・中期事業着手率」とは、地区別計画で実施時期を【短期】【中期】【継続】に位置づけた事業のうち、事業状況が〔完了〕〔継続〕〔実施中〕の事業の割合を示したものです。また、「短期・中期事業完了・継続率」とは、地区別計画で実施時期を【短期】【中期】【継続】に位置づけた事業のうち、事業状況が〔完了〕〔継続〕の事業の割合を示したものです。

なお、特定事業等の実施に向けた検討の結果、実現が困難と判断され実施しないこととした事業や、施設の閉館等の理由により予定事業を中止した事業は事業状況を〔その他〕として集計しています。

※本資料は速報版であり、確認がとれた事業(668/683 事業)を集計しています。

### (1) 全体着手率及び完了・継続率

区全域における事業全体着手率は82%となっており、事業全体完了・継続率は72%となっています。

また、短期・中期の事業着手率は92%、短期・中期の事業完了・継続率は89%となっており、目標年次までの実施を位置づけた事業については、概ね計画的進捗しています。

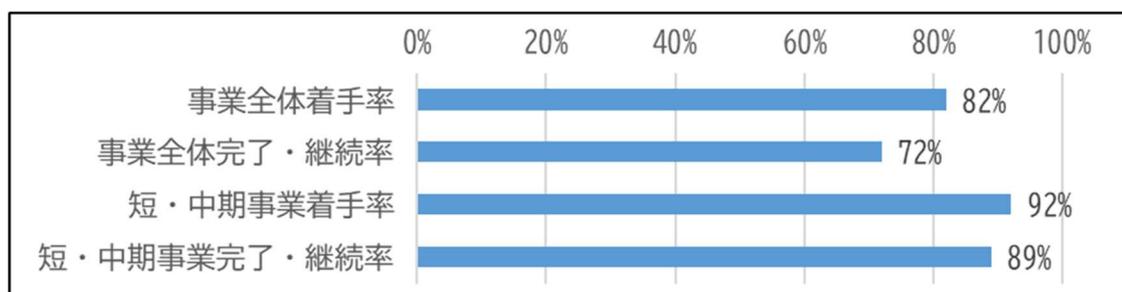


図 全体着手率及び完了・継続率

## (2) 地区別着手率及び完了・継続率

地区別に見ると、事業全体着手率では、下町隣接地域が88%と最も事業が推進されており、次いで山の手地域東部(86%)、山の手地域西部(84%)となっています(共通を除く)。

事業全体完了・継続率では、下町隣接地域が86%と最も事業が推進されており、次いで山の手地域東部(80%)、山の手地域西部(76%)となっています。

短期・中期事業着手率では、山の手地域西部が95%と最も事業が推進されており、次いで下町隣接地域(92%)、山の手地域東部(91%)となっています(共通を除く)。

短期・中期事業完了・継続率では、下町隣接地域が92%と最も事業が推進されており、次いで山の手地域西部(91%)となっています(共通を除く)。

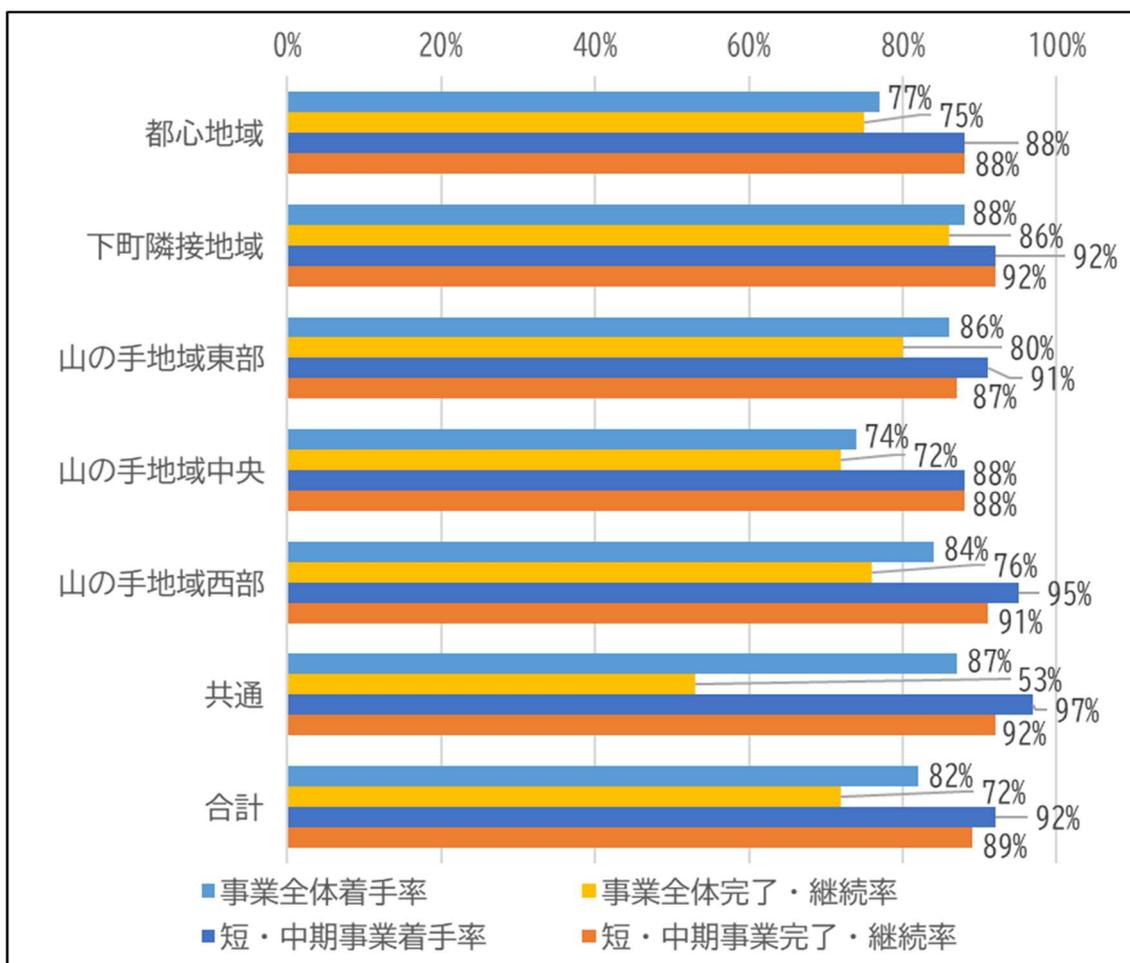


図 地区別着手率及び完了・継続率

### (3) 特定事業種別着手率及び完了・継続率

特定事業種別に見ると、交通安全特定事業は、事業全体着手率、短期・中期事業着手率、短期・中期事業完了・継続率が100%となっています。

公共交通特定事業、道路特定事業、建築物特定事業の短期・中期事業完了・継続率は90%以上となっており、概ね計画的に事業が進捗しています。

都市公園特定事業は他の事業種と比べて低く、短期・中期事業完了・継続率は65%となっています。

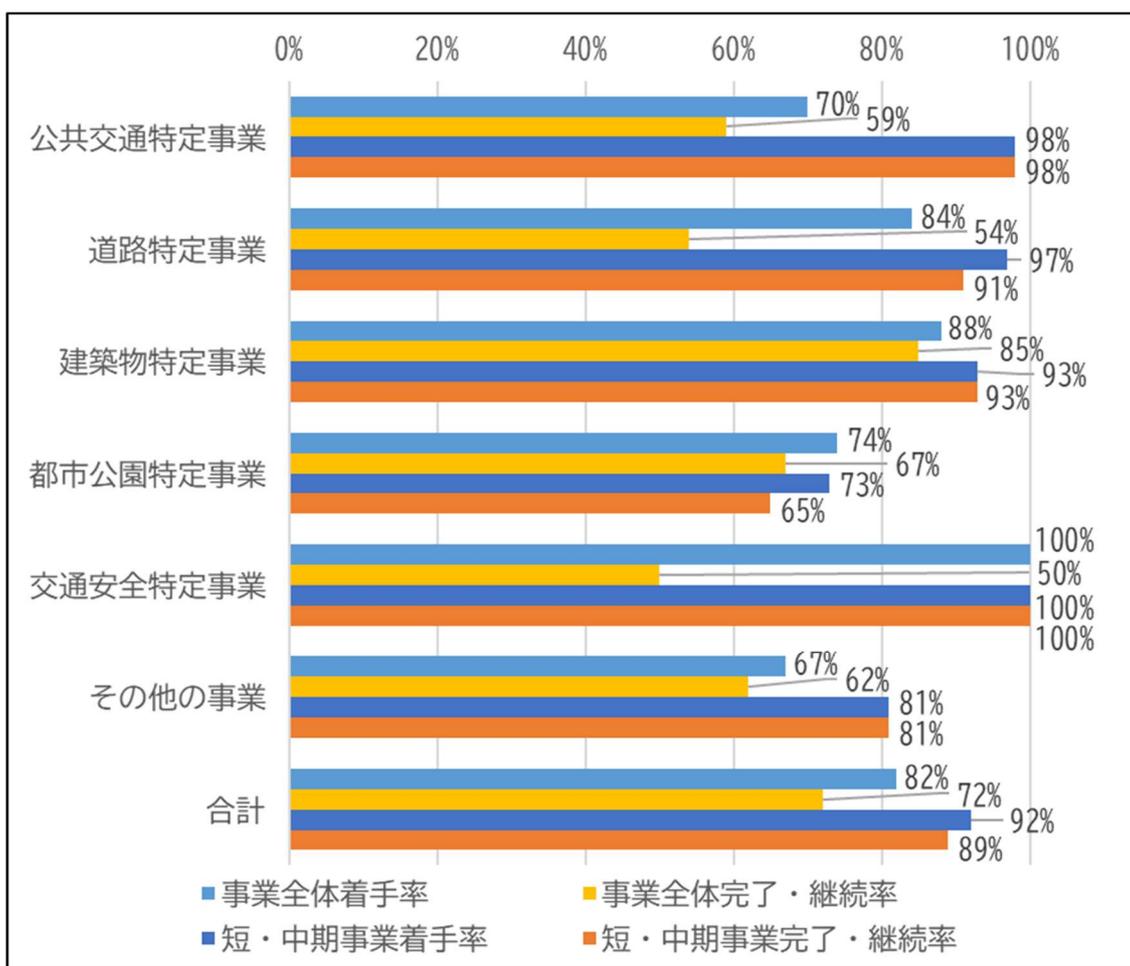


図 特定事業種別着手率及び完了・継続率

#### (4) ハード・ソフト分類別着手率及び完了・継続率

ハード・ソフト分類別に見ると、事業全体完了・継続率では、ハード事業が55%、ソフト事業が93%となっており、短期・中期事業完了・継続率では、ハード事業が81%、ソフト事業が96%となっています。

ソフト事業は職員・従業員等の研修や意識の啓発、案内表示の設置などの比較的容易に実施しやすい事業であることから、ハード事業と比べて着手率が高くなっていると考えられます。

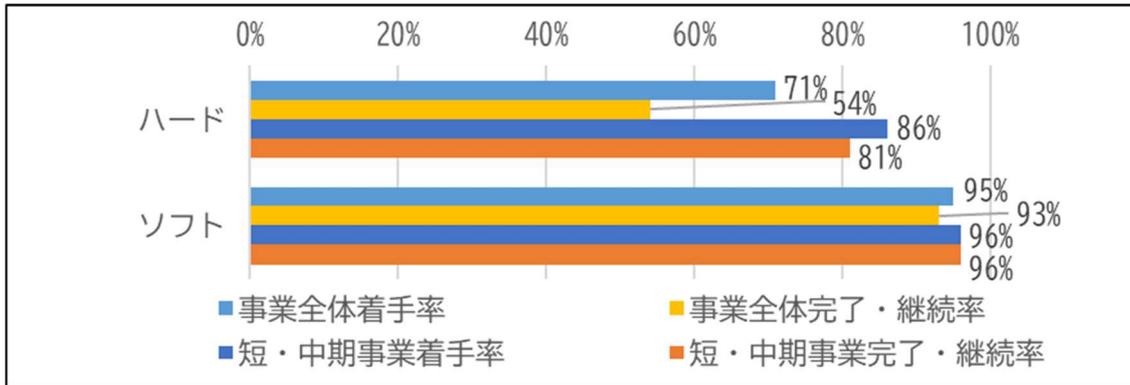


図 ハード・ソフト分類別着手率及び完了・継続率

令和7年度末時点(見込みを含む)の特定事業等の進捗状況整理表を次ページ以降に示します。

表 令和7年度末時点(見込みを含む)の特定事業等の進捗状況整理表(事業全体)

地区	事業状況	公共交通特定事業				道路特定事業						建築物特定事業				都市公園特定事業				交通安全特定事業		その他の事業				合計			実施 状況別 割合			
		鉄道		バス		国道		都道		区道		公共施設		民間施設		都立		区立		ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード		ソフト		
		ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト													
都心地域	全事業数	24	9			33							6	11	39	16	72	6	4			10				13	3	16	88	43	131	
	完了	15	7			22							3	2	17	7	29	5	3			8				7	1	8	47	20	67	
	継続	0	2			2							0	9	1	7	17	0	0			0				0	0	0	1	18	19	
	実施中	1	0			1							0	0	1	0	1	0	0			0				1	0	1	3	0	3	
	未着手	8	0			8							3	0	6	1	10	1	0			1				5	2	7	23	3	26	
	その他	0	0			0							0	0	14	1	15	0	1			1				0	0	0	14	2	16	
	着手率	67%	100%			76%							50%	100%	76%	93%	82%	83%	100%			89%				62%	33%	56%	69%	93%	77%	
	完了・継続率	63%	100%			73%							50%	100%	72%	93%	81%	83%	100%			89%				54%	33%	50%	65%	93%	75%	
下町隣接 地域	全事業数	4	2			6						10	30	12	5	57									4	1	5	30	38	68		
	完了	2	0			2						5	7	11	1	24									4	1	5	22	9	31		
	継続	0	2			2						0	21	0	3	24									0	0	0	0	26	26		
	実施中	0	0			0						0	0	0	1	1									0	0	0	0	1	1		
	未着手	2	0			2						4	1	1	0	6									0	0	0	7	1	8		
	その他	0	0			0						1	1	0	0	2									0	0	0	1	1	2		
	着手率	50%	100%			67%						56%	97%	92%	100%	89%									100%	100%	100%	76%	97%	88%		
	完了・継続率	50%	100%			67%						56%	97%	92%	80%	87%									100%	100%	100%	76%	95%	86%		
山の手地域 東部	全事業数	5	6			11						22	45	5	9	81	3	12	2	3	20							37	75	112		
	完了	0	6			6						16	9	2	4	31	0	4	2	1	7							20	24	44		
	継続	0	0			0						0	34	1	5	40	0	3	0	2	5							1	44	45		
	実施中	0	0			0						3	0	1	0	4	1	1	0	0	2							5	1	6		
	未着手	5	0			5						3	2	0	0	5	2	4	0	0	6							10	6	16		
	その他	0	0			0						0	0	1	0	1	0	0	0	0	0							1	0	1		
	着手率	0%	100%			55%						86%	96%	100%	100%	94%	33%	67%	100%	100%	70%							72%	92%	86%		
	完了・継続率	0%	100%			55%						73%	96%	75%	100%	89%	0%	58%	100%	100%	60%							58%	91%	80%		
山の手地域 中央	全事業数	27	9			36						17	45	13	18	93					9	3	12					66	75	141		
	完了	11	4			15						5	10	3	8	26					2	0	2					21	22	43		
	継続	0	5			5						2	35	2	8	47					1	1	2					5	49	54		
	実施中	2	0			2						1	0	0	0	1					0	0	0					3	0	3		
	未着手	12	0			12						9	0	4	2	15					6	2	8					31	4	35		
	その他	2	0			2						0	0	4	0	4					0	0	0					6	0	6		
	着手率	52%	100%			65%						47%	100%	56%	89%	83%					33%	33%	33%					48%	95%	74%		
	完了・継続率	44%	100%			59%						41%	100%	56%	89%	82%					33%	33%	33%					43%	95%	72%		
山の手地域 西部	全事業数	13	5			18						9	15	13	5	42					10	7	17					45	32	77		
	完了	3	1			4						7	3	8	0	18					8	3	11					26	7	33		
	継続	2	2			4						0	12	0	5	17					0	4	4					2	23	25		
	実施中	1	0			1						0	0	3	0	3					2	0	2					6	0	6		
	未着手	7	1			8						2	0	2	0	4					0	0	0					11	1	12		
	その他	0	1			1						0	0	0	0	0					0	0	0					0	1	1		
	着手率	46%	75%			53%						78%	100%	85%	100%	90%					100%	100%	100%					76%	97%	84%		
	完了・継続率	38%	75%			47%						78%	100%	62%	100%	83%					80%	100%	88%					62%	97%	76%		
共通	全事業数			6	9	15	19	5	36	7	40	9	116								6	2	8					107	32	139		
	完了			0	0	0	2	0	10	0	18	6	36								2	0	2					32	6	38		
	継続			0	7	7	4	3	5	7	4	2	25								0	2	2					13	21	34		
	実施中			6	2	8	7	2	18	0	7	0	34								4	0	4					42	4	46		
	未着手			0	0	0	5	0	2	0	11	0	18								0	0	0					18	0	18		
	その他			0	0	0	1	0	1	0	0	1	3								0	0	0					2	1	3		
	着手率			100%	100%	100%	72%	100%	94%	100%	73%	100%	84%									100%	100%	100%					83%	100%	87%	
	完了・継続率			0%	78%	47%	33%	60%	43%	100%	55%	100%	54%									33%	100%	50%					43%	87%	53%	
合計	全事業数	73	31	6	9	119	19	5	36	7	40	9	116	64	146	82	53	345	9	16	21	13	59	6	2	8	17	4	21	373	295	668
	完了	31	18	0	0	49	2	0	10	0	18	6	36	36	31	41	20	128	5	7	12	4	28	2	0	2	11	2	13	168	88	256
	継続	2	11	0	7	20	4	3	5	7	4	2	25	2	111	4	28	145	0	3	1	7	11	0	2	2	0	0	0	22	181	203
	実施中	4	0	6	2	12	7	2	18	0	7	0	34	4	0	5	1	10	1	1	2	0	4	4	0	4	1	0	1	59	6	65
	未着手	34	1	0	0	35	5	0	2	0	11	0	18	21	3	13	3	40	3	4	6	2	15	0	0	0	5	2	7	100	15	115
	その他	2	1	0	0	3	1	0	1	0	0	1	3	1	1	19	1	22	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	5	29
	着手率	52%	97%	100%	100%	70%	72%	100%	94%	100%	73%	100%	84%	67%	98%	79%	94%	88%	67%	73%	71%	85%	74%	100%	100%	100%	71%	50%	67%	71%	95%	82%
	完了・継続率	46%	97%	0%	78%	59%	33%	60%	43%	100%	55%	100%	54%	60%	98%	71%	92%	85%	56%	67%	62%	85%	67%	33%	100%	50%	65%	50%	62%	54%	93%	72%

※「実施状況別割合」は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

表 令和7年度末時点(見込みを含む)の特定事業等の進捗状況整理表(事業実施時期が「短期」「中期」「継続」の事業)

地区	事業状況	公共交通特定事業				道路特定事業						建築物特定事業				都市公園特定事業				交通安全特定事業		その他の事業		合計		実施状況別割合					
		鉄道		バス		国道		都道		区道		公共施設		民間施設		都立		区立		ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト						
		ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ソフト												
都心地域	全短・中期事業数	8	3			11							6	11	19	14	50			3			9	2	11	42	33	75			
	完了	8	1			9							3	2	15	7	27			3			7	1	8	33	14	47			
	継続	0	2			2							0	9	1	7	17			0			0	0	0	1	18	19			
	実施中	0	0			0							0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0			
	未着手	0	0			0							3	0	3	0	6			0			2	1	3	8	1	9			
	その他	0	0			0							0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0			
	短・中期着手率	100%	100%			100%							50%	100%	84%	100%	88%			100%			78%	50%	73%	81%	97%	88%			
短・中期完了・継続率	100%	100%			100%							50%	100%	84%	100%	88%			100%			78%	50%	73%	81%	97%	88%				
下町隣接地域	全短・中期事業数	2	2			4						9	30	9	4	52						4	1	5	24	37	61				
	完了	2	0			2						5	7	9	1	22						4	1	5	20	9	29				
	継続	0	2			2						0	21	0	3	24						0	0	0	0	26	26				
	実施中	0	0			0						0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0				
	未着手	0	0			0						4	1	0	0	5						0	0	0	4	1	5				
	その他	0	0			0						0	1	0	0	1						0	0	0	0	1	1				
	短・中期着手率	100%	100%			100%						56%	97%	100%	100%	90%						100%	100%	100%	83%	97%	92%				
短・中期完了・継続率	100%	100%			100%						56%	97%	100%	100%	90%						100%	100%	100%	83%	97%	92%					
山の手地域東部	全短・中期事業数											15	44	4	9	72	3	12	2	3	20				24	68	92				
	完了											13	9	2	4	28	0	4	2	1	7				17	18	35				
	継続											0	34	1	5	40	0	3	0	2	5				1	44	45				
	実施中											1	0	1	0	2	1	1	0	0	2				3	1	4				
	未着手											1	1	0	0	2	2	4	0	0	6				3	5	8				
	その他											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
	短・中期着手率											93%	98%	100%	100%	97%	33%	67%	100%	100%	70%				88%	93%	91%				
短・中期完了・継続率											87%	98%	75%	100%	94%	0%	58%	100%	100%	60%				75%	91%	87%					
山の手地域中央	全短・中期事業数	9	9			18						8	45	5	16	74			9	3	12				31	73	104				
	完了	9	4			13						3	10	3	7	23			2	0	2				17	21	38				
	継続	0	5			5						2	35	2	8	47			1	1	2				5	49	54				
	実施中	0	0			0						0	0	0	0	0			0	0	0				0	0	0				
	未着手	0	0			0						3	0	0	1	4			6	2	8				9	3	12				
	その他	0	0			0						0	0	0	0	0			0	0	0				0	0	0				
	短・中期着手率	100%	100%			100%						63%	100%	100%	94%	95%			33%	33%	33%				71%	96%	88%				
短・中期完了・継続率	100%	100%			100%						63%	100%	100%	94%	95%			33%	33%	33%				71%	96%	88%					
山の手地域西部	全短・中期事業数	3	4			7						9	15	6	5	35			9	7	16				27	31	58				
	完了	1	1			2						7	3	6	0	16			7	3	10				21	7	28				
	継続	2	2			4						0	12	0	5	17			0	4	4				2	23	25				
	実施中	0	0			0						0	0	0	0	0			2	0	2				2	0	2				
	未着手	0	1			1						2	0	0	0	2			0	0	0				2	1	3				
	その他	0	0			0						0	0	0	0	0			0	0	0				0	0	0				
	短・中期着手率	100%	75%			86%						78%	100%	100%	100%	94%			100%	100%	100%				93%	97%	95%				
短・中期完了・継続率	100%	75%			86%						78%	100%	100%	100%	94%			78%	100%	88%				85%	97%	91%					
共通	全短・中期事業数					7	7	10	3	12	7	24	8	64								2	2		46	27	73				
	完了					0	0	2	0	7	0	18	6	33								0	0		27	6	33				
	継続					7	7	4	3	5	7	4	2	25								2	2		13	21	34				
	実施中					0	0	2	0	0	0	2	0	4								0	0		4	0	4				
	未着手					0	0	2	0	0	0	0	0	2								0	0		2	0	2				
	その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0		0	0	0				
	短・中期着手率					100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	97%								100%	100%		96%	100%	97%				
短・中期完了・継続率					100%	100%	60%	100%	100%	100%	92%	100%	91%								100%	100%		87%	100%	92%					
合計	全短・中期事業数	22	18			7	47	10	3	12	7	24	8	64	47	145	43	48	283	3	15	20	13	51	194	269	463				
	完了	20	6			0	26	2	0	7	0	18	6	33	31	31	35	19	116	0	7	11	4	22	135	75	210				
	継続	2	11			7	20	4	3	5	7	4	2	25	2	111	4	28	145	0	3	1	7	11	22	181	203				
	実施中	0	0			0	0	2	0	0	0	2	0	4	1	0	1	0	2	1	1	2	0	4	9	1	10				
	未着手	0	1			0	1	2	0	0	0	0	0	2	13	2	3	1	19	2	4	6	2	14	28	11	39				
	その他	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1				
	短・中期着手率	100%	94%			100%	98%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	72%	99%	93%	98%	93%	33%	73%	70%	85%	73%	100%	100%	85%	67%	81%	86%	96%
短・中期完了・継続率	100%	94%			100%	98%	60%	100%	100%	100%	92%	100%	91%	70%	99%	91%	98%	93%	0%	67%	60%	85%	65%	100%	100%	85%	67%	81%	81%	96%	89%

※「実施状況別割合」は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

### 3 完了した事業

特定事業等のうち、令和7年度末時点(見込みを含む)で完了した事業について下表に整理しました。

表 完了事業(令和7年度末時点(見込みを含む):256事業)

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業システム
公共交通特定事業	①	都営地下鉄 大江戸線 飯田橋駅	都心地域	トイレ	トイレの洋式化、ベビーチェアの増設	ハード
				案内設備	C2 出入口の音声案内設置	ハード
				案内設備	エスカレーターの設置状況のわかりやすい表示	ソフト
	②	東京メトロ 有楽町線 江戸川橋駅	山の手 地域西部	通路/ ホーム	駅構内の十分な照度の確保	ハード
				上下 移動	エレベーター内の鏡の改修	ハード
				案内 設備	出入口への音声案内又は触知案内板の設置	ハード
				案内 設備	地上へのエレベーターのわかりやすい案内表示の設置	ソフト
	③	東京メトロ 丸ノ内線 御茶ノ水駅	都心地域	ホーム	ホームドアへの点字表示方法の改善	ソフト
				ホーム	ベンチの増設	ハード
				券売機 等	点字運賃表への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	ハード
				トイレ	多機能トイレへの荷物台や低い位置への荷物掛けの設置	ハード
				案内 設備	わかりやすい案内表示への改善(出入口・エレベーター・幅広改札)	ソフト
				案内 設備	音声案内の設置	ハード
				案内 設備	手すりへの案内表示の改善(点字・墨字)	ソフト
	④ ⑤	都営地下鉄 三田線・大江戸 線 春日駅	都心地域	上下 移動	エレベーターの増設(三田線目黒方面ホーム～地上)	ハード
				トイレ (三田線)	出入口の段差解消(スロープ化)、トイレの洋式化、簡易型多機能便房の設置、ベビーチェアの増設など	ハード
				トイレ (大江戸線)	トイレの洋式化、ベビーチェアの増設	ハード
				案内 設備	バリアフリールートや乗換経路等のわかりやすい案内表示	ソフト
	⑥	東京メトロ 丸ノ内線・南北 線 後楽園駅	都心地域	案内 設備	わかりやすい案内表示への改善(バリアフリー経路・設備・トイレ等)	ソフト

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
公共交通特定事業	6	東京メトロ 丸ノ内線・南北 線 後樂園駅	都心地域	案内 設備	乗換のバリアフリー経路に 関する案内表示の設置	ソフト
				人的 対応	無人改札口の問合せ対応強 化（触知案内図整備等）	ハード
				車両	十分な広さの車いすスペ ースを確保した車両への代替	ハード
	7	東京メトロ 有楽町線 護国寺駅	山の手 地域中央	全体	駅構内の十分な照度の確保	ハード
				上下 移動	エレベーターへの足元まで 見える鏡の設置	ハード
				上下 移動	エレベーターの増設	ハード
				上下 移動	エスカレーターを設置（1番 出入口～改札階）	ハード
				トイレ	多機能トイレの案内表示の 改善	ソフト
				案内 設備	触知案内図の更新	ハード
	8	東京メトロ 丸ノ内線 新大塚駅	山の手 地域中央	ホーム	構内の十分な照度の確保	ハード
				案内 設備	案内表示の改修	ソフト
	9	都営地下鉄 三田線 水道橋駅	都心地域	出入口 ・通路	視覚障害者誘導用ブロックの 配置見直し・補修	ハード
				トイレ	出入口の段差解消（スロープ 化）、トイレの洋式化、簡易型 多機能便房の設置、ベビーチ ェアの増設など	ハード
	10	都営地下鉄 三田線 千石駅	山の手 地域東部	ホーム	通路が狭くなる箇所における 掲示等の改善の検討	ソフト
券売機 等				点字運賃表の位置の改善の検 討	ソフト	
案内 設備				改札口からエレベーターへの わかりやすい案内表示の設置 の検討	ソフト	
11	東京メトロ 千代田線 千駄木駅	下町隣接 地域	ホーム	ホームドアの設置	ハード	
13	東京メトロ 千代田線 根津駅	下町隣接 地域	ホーム	ホームドアの設置	ハード	
14	都営地下鉄 三田線 白山駅	山の手 地域東部	上下 移動	エレベーター横の点字案内 の位置の改善の検討	ソフト	
			トイレ	点字案内の位置の改善の検 討	ソフト	
			案内 設備	バリアフリー化された出口 がわかる案内の表示の検討	ソフト	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
公共交通特定事業	16	都営地下鉄 大江戸線 本郷三丁目駅	都心地域	トイレ	トイレの洋式化、ベビーチェア の増設	ハード
	18	東京メトロ 丸ノ内線 茗荷谷駅	山の手 地域中央	上下 移動	階段への通行区分サインの 設置	ハード
				ホーム	緊急停止ボタンの増設の検討	ハード
				トイレ	トイレの洋式化	ハード
				案内 設備	自動旅客案内装置の増設	ハード
				案内 設備	内容がよりわかりやすい電 光掲示板への改修	ハード
	案内 設備	エレベーターへのわかりや すい案内表示の設置	ソフト			
19	東京メトロ 千代田線 湯島駅	都心地域	ホーム	ホームドアの設置	ハード	
道路特定事業	-	国道 17 号 (本郷通り)	山の手 地域東部	整備	中央分離帯への視覚障害者 誘導用ブロックの敷設	ハード
	-	国道 254 号 (春日通り)	山の手 東・中 地域共通	整備	中央分離帯への視覚障害者 誘導用ブロックの敷設	ハード
	-	都道 8 号 (目白通り)	山の手 地域共通	整備	視覚障害者誘導用ブロック の設置	ハード
				整備	歩道の勾配の緩和	ハード
				整備	歩道橋設置箇所における歩 道の幅員確保	ハード
				整備	歩車道境界部における適切 な段差への改善	ハード
	-	都道 301 号 (白山通り)	都心地域	整備	移動等円滑化基準に適合し た道路の整備（交差点部の勾 配の緩和、視覚障害者誘導用 ブロックの敷設等）	ハード
				整備/ 安全対策	自転車走行空間の整備	ハード
	-	都道 437 号 (不忍通り)	山の手 地域共通	整備	無電柱化事業にあわせたバ リアフリー化（段差解消・勾 配の緩和等）（文京区音羽 2 丁 目～目白台 2 丁目）	ハード
				整備	第三護国寺前歩道橋への両 側手すりの設置の検討	ハード
				安全 対策	第三護国寺前歩道橋周辺の 安全対策の検討	ハード
	-	都道 452 号 (大観音通り)	山の手 地域東部	整備	無電柱化事業にあわせたバ リアフリー化（向丘 1 丁目）	ハード
	-	区道 870 号	下町隣接 地域	案内 設備	多様な利用者に配慮した見 やすくわかりやすい案内表 示の設置	ソフト

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
道路特定事業	—	区道 889 号	都心地域	案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	ソフト
	—	区道 890 号	都心地域	整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
	—	区道 892 号	都心地域	整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	ソフト
	—	区道 900 号 (蔵前橋通り)	都心地域	整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
	—	区道 982 号	下町隣接地域	整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	ハード
				案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	ソフト
	—	区道千文 3 号 (御茶ノ水橋)	都心地域	整備	お茶の水橋の補修補強工事とあわせた駅側の歩道幅員の拡幅	ハード
	—	区道 869 号	下町隣接地域	整備	道路整備事業等にあわせた幅員構成の再検討、及びコミュニティ道路の整備	ハード
	—	区道 808 号	都心地域	整備	自転車走行空間の整備	ハード
	—	区道文台 3 号	下町隣接地域	整備	道路整備事業にあわせた幅員構成の見直し	ハード
	—	区道 889 号	山の手西・中地域共通	案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内標示の設置	ソフト
	—	区道 892 号	山の手地域東部	整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内標示の設置	ソフト
	—	区道 893 号	山の手地域中央	整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置及び JIS 規格に適合したブロックへの更新	ハード
				安全対策	坂道への助け合いの意識を喚起する標識や勾配の案内の設置	ハード
—	区道 158 号・156 号・164 号・163 号・899 号	山の手地域中央	安全対策	坂道への助け合いの意識を喚起する標識や勾配の案内の設置	ハード	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
道路特定事業	—	区道 843 号	山の手地域中央	整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し）の推進	ハード
	—	区道 844 号	山の手地域中央	整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し）の推進	ハード
	—	区道 901 号	山の手地域中央	整備	道路整備事業にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	ハード
	—	区道 11 号・898 号	山の手地域西部	整備	道路整備事業にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	ハード
	—	区道 841 号	山の手地域西部	安全対策	坂道への助け合いの意識を喚起する標識や勾配の案内の設置	ハード
	—	区道 894 号	山の手地域東部	整備	道路整備事業等にあわせたコミュニティ道路の整備（歩道の設置等）	ハード
建築物特定事業	①	文京シビックセンター・シビックホール	都心地域	トイレ	オストメイト、ベビーチェア、ベビーベッドの増設や多目的トイレの自動扉化などトイレのバリアフリー化の推進	ハード
				その他設備	（シビックホール）シビックチケットへの荷物置場等の設置	ハード
	③	大原地域活動センター	山の手地域東部	人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	④	大塚地域活動センター	山の手地域中央	人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	⑤	音羽地域活動センター	山の手地域中央	人的対応心のバリアフリー	（音羽地域活動センター）筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	⑥	湯島地域活動センター・総合体育館	下町隣接地域	案内設備	大きくわかりやすい案内表示やサインの適切な位置への設置	ソフト
総合体育館出入口				インターホンが押しやすい椅子等の配置の工夫	ソフト	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	7	向丘地域活動センター・アカデミー向丘	山の手地域東部	出入口・敷地内通路	敷地境界へのミラーの設置	ハード
				人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	8	不忍通りふれあい館（根津地域活動センター・根津図書室）	下町隣接地域	トイレ	トイレ出入口へのスロープ設置	ハード
				トイレ	トイレ外部への段差注意喚起の表示	ソフト
				案内設備	受付への筆談具の配置	ソフト
	10	駒込地域活動センター	下町隣接地域	トイレ	一般トイレの洋式トイレへの改修	ハード
	12	千駄木交流館	下町隣接地域	出入口・敷地内通路	段差の解消	ハード
				トイレ	一般トイレの洋式トイレへの改修	ハード
	13	目白台総合センター（目白台交流館・目白台第二児童館）	山の手地域西部	トイレ	（目白台第二児童館）トイレの洋式化	ハード
	14	根津総合センター（根津交流館・根津児童館）	下町隣接地域	トイレ	（根津交流館）一般トイレの洋式トイレへの改修	ハード
	17	湯島総合センター（湯島第二会館・文京福祉センター湯島・湯島児童館・湯島図書館）	都心地域	建物内通路	職員による案内の実施	ソフト
				トイレ	多機能トイレ・一般トイレ設備のバリアフリー化	ハード
				案内設備	バリアフリー設備等の情報がわかる案内図の設置	ソフト
	18	駕籠町会館	山の手地域東部	全体	大規模改修工事におけるバリアフリー化	ハード
19	男女平等センター	山の手地域東部	トイレ	一般トイレの洋式化	ハード	
			人的対応心のバリアフリー	筆談用具の設置	ソフト	
20	区民センター	山の手地域東部	建物内通路	段差解消のためのスロープ設置（保育園側出入口付近）	ハード	
			人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト	
21	大塚公園集会所・大塚公園みどりの図書室	山の手地域中央	案内設備	バリアフリー設備への音声案内や触知案内図の設置	ハード	
			案内設備	多様な利用者に対応した案内表示、案内図の設置	ソフト	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	㉑	大塚公園集会所・大塚公園みどりの図書室	山の手地域中央	人的対応心のバリアフリー	(大塚公園みどりの図書室) 筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	㉒	勤労福祉会館(本郷福祉センター(若駒の里)・本駒込図書館)	下町隣接地域	案内設備	バリアフリー設備や非常時の経路等情報がわかる案内図などの設置	ソフト
	㉓	小石川郵便局	山の手地域中央	建物内通路	チラシ置き場の転倒防止及び移設等による通路の安全性の確保	ソフト
				案内設備	各窓口の対応業務などがわかる案内板の設置	ソフト
				案内設備	駐輪場へ誘導する案内表示の設置	ソフト
				その他設備	ATM前への整列案内の表示	ソフト
				人的対応心のバリアフリー	筆談用具及び耳マークの設置	ソフト
	①	文京総合福祉センター(障害者支援施設・障害者基幹相談支援センター・文京福祉センター江戸川橋・子育てひろば江戸川橋など)	山の手地域中央	出入口・敷地内通路	視覚障害者誘導用ブロックを避けた位置への足ふきマットの設置	ソフト
				案内設備	案内表示の設置	ソフト
	⑥	文京白山高齢者在宅サービスセンター・高齢者あんしん相談センター富坂・文京白山の郷	山の手地域東部	人的対応心のバリアフリー	コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示	ソフト
	⑦	文京向丘高齢者在宅サービスセンター	下町隣接地域	人的対応心のバリアフリー	コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示	ソフト
⑧	文京本郷高齢者在宅サービスセンター	山の手地域東部	人的対応心のバリアフリー	コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示	ソフト	
㉑	小日向台町児童館	山の手地域中央	トイレ	トイレの洋式化	ハード	
㉓	子育てひろば西片	山の手地域東部	出入口・敷地内通路	施設玄関の電子錠化による施設利用時間内の門扉の解放(門扉開閉の負担軽減)	ハード	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	5	日本医科大学 附属病院	下町隣接 地域	出入口 ・敷地 内通路	歩道上から案内施設までの スロープの設置、及び視覚障 害者誘導用ブロックの設置	ハード
				建物内 通路	段差へのスロープの設置	ハード
				上下 移動	車いす使用者に配慮したエ レベーターの設置	ハード
				上下 移動	階段の両側への手すりの設 置、及び段鼻の色の強調	ハード
				トイレ	多様な利用者に配慮した多 機能トイレの設置	ハード
				トイレ	一般トイレの広めの個室ブ ースの設置	ハード
				駐輪場・ 駐車場	基準適合した障害者用駐車 施設の設置	ハード
				案内 設備	建物入口にバリアフリー施 設の位置がわかる視覚障害 者用案内板の設置	ソフト
				その他 設備	授乳室の設置	ハード
				その他 設備	ベンチの設置	ハード
	7	東京大学医学 部附属病院	下町隣接 地域	トイレ	大規模改修にあわせたトイレ 設備の改善	ハード
				駐車場	出入口付近への障害者用駐 車場の設置	ハード
	9	順天堂大学 医学部附属 順天堂医院	都心地域	出入口 ・敷地 内通路	歩道上空地（一部は公開空 地）による敷地周辺歩道の拡 幅	ハード
				出入口 ・敷地 内通路	外堀通り沿いに緑地帯を整 備	ハード
上下 移動				エレベーターへの視聴覚障 害者対応設備の設置	ハード	
上下 移動				1号館エスカレーターの手速 を遅くするための架け替え	ハード	
上下 移動				1号館エスカレーターに注意 喚起のためのベルトサイン （英語表記含む）の取付け	ハード	
その他 設備	利用者の安全確保のための 監視カメラと緊急呼出設備 の設置（屋上庭園）	ハード				
1	文京区教育セン ター	下町隣接 地域	案内 設備	色や形に配慮した施設名表 示の工夫	ソフト	
4	拓殖大学（文京 キャンパス）	山の手 地域中央	建物内 通路	視覚障害者誘導用ブロック を避けた位置への足ふきマ ットの設置位置の改善	ソフト	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	4	拓殖大学(文京キャンパス)	山の手地域中央	トイレ	多機能トイレへの荷物台・荷物掛けの設置	ハード
				案内設備	多機能トイレへのオストメイト対応設備の案内表示	ソフト
	8	東洋学園大学(本郷キャンパス)	都心地域	上下移動	エレベーターの車いす対応への改修(4号館)	ハード
				上下移動	エレベーターに障害者が優先的に利用できるよう案内を表示(4号館)	ソフト
				トイレ	一般トイレの改修(和式→洋式)(4号館)	ハード
				その他設備	貸出用車いすの設置	ソフト
				出入口・敷地内通路	出入口のスロープの改修(4号館)	ハード
	9	日本女子大学(目白キャンパス)	山の手地域西部	建物内通路	基準適合したスロープへの改修(香雪館)	ハード
				建物内通路	既存スロープの勾配の改善(七十年館)	ハード
				上下移動	エレベーターの設置(香雪館)	ハード
				トイレ	車いす対応トイレの増設(百年館)	ハード
	10	文京学院大学(本郷キャンパス)	山の手地域東部	出入口・敷地内通路	生涯学習センター出入口の段差への注意喚起の表示	ソフト
				上下移動	階段への連続した手すりの設置・更新	ハード
				案内設備	バリアフリールートのはっきりとした案内表示の設置	ソフト
				案内設備	キャンパスガイドへのバリアフリー情報の表記	ソフト
				案内設備	利用者にわかりやすい案内表示の総合的な検討	ソフト
	14	貞静学園短期大学	山の手地域中央	トイレ	車いすトイレの非常ボタンへの点字表示	ソフト
				トイレ	温水洗浄便座の設置の検討	ハード
				案内設備	非常口への誘導灯や標識の適切な設置方法の検討	ハード
	19	アカデミー音羽	山の手地域中央	トイレ	洋式化など、トイレのバリアフリー化の推進	ハード
案内設備				わかりやすく、利用しやすい案内表示への改修	ソフト	
20	アカデミー千石・千石図書館	山の手地域東部	出入口・敷地内通路	視覚障害者誘導用ブロックの連続設置(歩道から門まで)	ハード	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	20	アカデミー千石・千石図書館	山の手地域東部	出入口・敷地内通路	敷地内通路の舗装の改善	ハード
				建物内通路	手すり端部の安全対策（2階通路）	ハード
				建物内通路	窓口への視覚障害者誘導用ブロックの連続設置	ハード
				建物内通路	十分な幅員の確保	ハード
				トイレ	多機能トイレへの荷物台・荷物掛けの設置	ハード
				トイレ	一般トイレ内の段差の解消	ハード
				トイレ	トイレの洋式化	ハード
				上下移動	階段の上下端への視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				案内設備	手すりへの点字表示	ソフト
				人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	22	真砂中央図書館	山の手地域東部	人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	23	小石川図書館	山の手地域中央	トイレ	トイレの洋式化	ハード
				案内設備	全体案内図の改修	ソフト
				人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	24	水道端図書館	山の手地域西部	トイレ	トイレの洋式化	ハード
				人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト
	25	目白台図書館	山の手地域西部	建物内通路	JIS 規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				上下移動	視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法の改善	ハード
				トイレ	多機能トイレの手すりの改善	ハード
				トイレ	トイレの洋式化	ハード
				案内設備	書架サインの改修	ソフト
その他設備				カウンターの改修	ハード	
人的対応心のバリアフリー	筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置	ソフト				

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	29	史跡湯島聖堂財団法人斯文会	都心地域	出入口	西門から大成殿前の段差解消（文化財のため改修は行わず、仮設スロープの設置で対応）	ハード
				敷地内通路	会館内通路上の物品の除去による十分な幅員の確保（120cm）	ソフト
				案内設備	コミュニケーションボードや筆談具の設置	ソフト
	38	東京ドーム（野球殿堂博物館含む）	都心地域	上下移動	階段の段鼻の強調（屋外部）	ハード
				上下移動	後樂園駅前歩道橋階段部への視覚障害者誘導用ブロック（点状）の設置（人工地盤への階段）	ハード
				案内設備	屋外案内サインの整備（外国語対応・ピクトグラム）	ソフト
				その他設備	車いす用観客席からの観覧しやすさの向上	ハード
				その他設備	車いす用観客席の増設	ハード
	40	文京スポーツセンター	山の手地域中央	全体	大規模改修工事におけるバリアフリー化	ハード
	42	江戸川橋体育館	山の手地域中央	案内設備	オストメイト対応の案内表示の設置	ソフト
	2	文京グリーンコート	山の手地域東部	敷地内通路	視覚障害者誘導用ブロックの設置の検討	ハード
				敷地内通路	舗装の補修	ハード
	3	ラクーア	都心地域	建物内通路	敷地入口からバリアフリーエレベーターまでの視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				建物内通路	目の細かいグレーチングへの更新（後樂園駅側バリアフリーエレベーター誘導路）	ハード
				上下移動	エレベーターへの点字表示（後樂園側バリアフリーエレベーターカゴ内）	ソフト
				トイレ	一般トイレ個室ブース内への低い位置の荷物かけの設置	ハード
				案内設備	案内サインの整備（外国語対応、ピクトグラム等）	ソフト
6	ホテル椿山荘東京	山の手地域西部	上下移動	エレベーターのバリアフリー化（車いす使用者対応の操作ボタン・足元まで見える鏡の設置等）	ハード	
			トイレ	男女共用トイレの設置	ハード	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
特定建築物 建築事業	△6	ホテル椿山荘 東京	山の手 地域西部	客室	ユニバーサルルームの出入口の拡幅及び扉の改修	ハード
				客室	ユニバーサルルームの適切な照度の確保	ハード
	△9	ホテル機山館	山の手 地域東部	上下移動	エレベーターのバリアフリー化（点字表示）	ハード
都市公園特定事業	①	六義園	山の手 地域東部	案内設備	わかりやすい案内表示への改善（字の大きさ、トイレへの誘導など）	ソフト
				案内設備	案内パンフレットの表示方法の見直し	ソフト
				案内設備	悪路対応車いすの貸出に関する案内表示の設置	ソフト
				人的対応心のバリアフリー	コミュニケーション支援ボードや筆談用具の設置及び耳マークの表示	ソフト
	③	肥後細川庭園	山の手 地域西部	園路	主要な園路の傾きや段差の解消	ハード
	④	目白台運動公園	山の手 地域西部	管理棟	階段の手すりの取替	ハード
				管理棟	階段蹴上げ部分の安全対策（つまずき防止）の実施	ハード
				管理棟	案内板の改修（凡例の明記、点字シールの貼付）	ソフト
				管理棟	筆談用具及び耳マークの設置	ソフト
				トイレ	多機能トイレの扉の改修	ハード
				トイレ	移乗手すりの移設	ハード
				トイレ	ごみ入れの移動	ソフト
	⑤	江戸川公園	山の手 地域西部	出入口	車止めの再配置（西側出入口）	ハード
				園路	主要な園路の傾きや段差の解消（東側出入口付近、西側出入口～トイレは短期的に対応）	ハード
				トイレ	だれでもトイレの設置	ハード
	⑥	小石川後樂園	都心地域	園路	工事等の仮園路におけるバリアフリーへの配慮	ハード
				トイレ	涵徳亭内トイレの改修	ハード
				休憩施設	状況に応じたベンチの配置	ハード
				案内設備	高齢者・障害者等に配慮した園内案内の改善（受付・トイレ案内等）	ソフト
				案内設備	トイレへの音声案内設置	ハード
案内設備				耳マークの表示	ソフト	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統	
都市公園特定事業	6	小石川後楽園	都心地域	人的対応 心のバリアフリー	高齢者・障害者等に配慮した案内(ソフト対策)の充実(パンフレットやWEBページ等)	ソフト	
				その他設備	涵徳亭入口スロープへの柵の設置(建物内部)	ハード	
	8	教育の森公園・占春園	山の手地域中央	園路	(教育の森公園)主要な園路のバリアフリー化	ハード	
				トイレ	(教育の森公園)だれでもトイレの設置	ハード	
	9	六義公園・六義公園運動場	山の手地域東部	出入口/園路	(六義公園)視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード	
				トイレ	(六義公園)トイレの建替にあわせてだれでもトイレの整備	ハード	
				案内設備	(六義公園)よりわかりやすい案内表示の設置	ソフト	
	特定交通安全	-	全体	都心・下町共通	信号機等	標識、標示の高輝度化や信号機のLED化	ハード
		-	全体	山の手地域共通	信号機等	標識、標示の高輝度化や信号機のLED化	ハード
その他の事業	-	後楽公園	都心地域	園路	小石川後楽園方面への車いす使用者に配慮した園路の舗装や案内表示	ハード	
				トイレ	多機能トイレへの子ども用便座の設置	ハード	
				案内設備	出入口付近に小石川後楽園への案内の設置	ソフト	
	-	礪川公園	都心地域	上下移動	階段の始末端部への視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード	
				園路	トイレ前の勾配の改善	ハード	
	-	須藤公園	下町隣接地域	出入口	出入口の改修(段差や勾配の解消、幅員の確保、視覚障害者誘導用ブロックの設置)	ハード	
				園路	十分な幅員の確保	ハード	
				トイレ	トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置	ハード	
				休憩施設	ベンチ等の設置	ハード	
				案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置	ソフト	
	-	御茶の水橋際公衆便所	都心地域	トイレ	開閉しやすい扉への改善	ハード	
	-	船河原橋際公衆便所	都心地域	トイレ	トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置	ハード	
-	後楽橋際公衆便所	都心地域	トイレ	トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置	ハード		

#### 4 未完了の短・中期事業とその要因

地区別計画にて実施時期を【短期】【中期】とした特定事業等のうち、令和7年度末時点(見込みを含む)で未完了であった事業と主な要因を以下に示します。

表 未完了事業(令和7年度末時点(見込みを含む):46事業)

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
道路特定事業	—	国道17号 (本郷通り)	都心・ 下町共通	整備/ 安全対策	自転車走行空間の整備	ハード
	—	国道254号 (春日通り)	都心地域	整備/ 安全対策	自転車走行空間の整備	ハード
	—	国道17号(本郷通り、白山通り、旧白山通り)	山の手 地域東部	整備	歩きやすい舗装への改善(本郷通り)	ハード
				整備	大規模改修時のセミフラット化	ハード
	—	区道836号	都心地域	整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
—	区道834号	都心地域	整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化(段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置)の推進	ハード	
建築物特定事業	⑥	湯島地域活動センター・総合体育館	下町隣接 地域	出入口・敷地内通路	出入口への音声案内の設置	ハード
				案内設備	トイレへの音声案内や触知案内図の設置	ハード
	⑧	不忍通りふれあい館(根津地域活動センター・根津図書室)	下町隣接 地域	その他設備	サービスコーナーの改良(通路の幅員確保・車いす使用者が接近しやすい構造)	ハード
	⑩	駒込地域活動センター	下町隣接 地域	トイレ	段差の解消	ハード
	⑮	白山東会館・白山東児童館	山の手 地域東部	トイレ	(白山東児童館) トイレの洋式化	ハード
	⑰	湯島総合センター(湯島第二会館・文京福祉センター湯島・湯島児童館・湯島図書館)	都心地域	出入口・敷地内通路	道路から出入口の位置がわかるような案内表示・音声案内の設置	ハード
				出入口・敷地内通路	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
			上下移動	階段部手すりの安全な処理	ハード	
⑳	小石川郵便局	山の手 地域中央	その他設備	高齢者に配慮した高さのいすの設置	ソフト	

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
建築物特定事業	9	順天堂大学 医学部附属 順天堂医院	都心地域	トイレ	多機能トイレの扉を自動ドア化（B棟、C棟）	ハード
	10	文京学院大学 （本郷キャンパス）	山の手 地域東部	建物内 通路	共用廊下への人感センサーによる照明設備の設置	ハード
	20	アカデミー千石・千石図書館	山の手 地域東部	トイレ	多機能トイレのL字型手すりの設置位置の改善	ハード
				その他 設備	背もたれのある椅子の設置	ソフト
	23	小石川図書館	山の手 地域中央	トイレ	非常呼出ボタン及び警報ランプの設置	ハード
				トイレ	非常事態を聴覚障害者等に伝えるフラッシュライト等の設置	ハード
				案内 設備	出入口やトイレ、エレベーター等への音声案内の設置	ハード
	25	目白台図書館	山の手 地域西部	出入口・敷地内 通路	JIS規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				トイレ	非常事態を聴覚障害者等に伝えるフラッシュライト等の設置	ハード
	36	森鷗外記念館	下町隣接 地域	案内 設備	敷地内での車いす使用者用駐車場への案内表示の設置	ソフト
都市公園特定事業	1	六義園	山の手 地域東部	出入口	道路から出入口の位置がわかるような案内表示・音声案内の設置の検討（道路管理者との連携）	ハード
				トイレ	トイレの改修にあわせたバリアフリー化（トイレの前の勾配の緩和、多機能トイレの改修等）	ハード
				案内 設備	トイレの音声案内の内容の見直しの検討	ソフト
				案内 設備	触知案内板の設置の検討及び音声案内の設置の必要性を含めた検討	ハード
				案内 設備	わかりやすい案内板の設置検討	ソフト
				案内 設備	多言語対応の音声ガイドの導入の必要性を含めた検討	ソフト
				案内 設備	園内マップの点字パンフレットの設置の必要性を含めた検討	ソフト
				その他 設備	点字表示による案内の設置検討	ソフト

事業種別	凡例	事業箇所	地域	項目	事業内容	事業系統
都市公園特定事業	2	大塚公園	山の手 地域中央	出入口/ 園路	歩道上から主要な園路及び階段部への視覚障害者誘導用ブロックの設置	ハード
				出入口	がたつきのない舗装への改修	ハード
				園路	階段の両側への手すりの設置	ハード
				園路	スロープの勾配の緩和	ハード
				トイレ	建替工事にあわせたトイレのバリアフリー化（扉の改良、JIS 規格に適合した物の配置等）	ハード
				トイレ	案内図やわかりやすい案内表示の設置	ソフト
				トイレ	目隠し用の壁の設置	ハード
				案内設備	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報がわかる案内図やわかりやすい案内表示の設置	ソフト
	4	目白台運動公園	山の手 地域西部	出入口	歩道上から出入口まで視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携）	ハード
				園路	排水溝部への車いすで通れる平坦部の確保	ハード
その他の事業	—	後楽公園	都心地域	出入口	歩道から出入口、主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの敷設	ハード
				休憩施設	夏季における日陰の確保及びベンチの設置	ハード
				案内設備	視覚障害者に対応したトイレ案内の設置	ソフト

## 【未着手の主な要因】

### <事業実施方法の検討>

- ・設置可否検討中。（建築物）
- ・解消方法について検討中。（建築物） など

### <予算の確保>

- ・予算の都合により、事業実施が困難なため。（建築物） など

### <事業実施時期の変更>

- ・警視庁の協議及び工事を継続実施中。（道路）
- ・一部実施済みだが、その他区間については、R7年度からR8年度にかけてバリアフリー整備工事を実施予定。（道路） など

### <関連事業等の影響>

- ・公園再整備事業の中で対応する予定であり、順次、事業を進めているため。（公園）
- ・令和7年8月からの施設全体の改修工事にて実施予定（令和8年6月末まで工事実施）。（建築物） など
